


概略工事工程表	
1	概略工事工程表

[illegible]

工程上の留意事項

1. アリーナの使用停止期間は12月～3月を予定しているため、アリーナ内施工はこの期間に行うこと。なおアリーナ使用不可となる期間は極力短縮すること。
2. アリーナ使用停止期間中に別途照明LED化工事が行われるため、工程調整に協力すること。
3. 別途工事で機械室内の機器を撤去した後に、本工事で自家発電設備を設置するため、監督員及び施設と十分に調整すること。
4. 自家発電停止期間は、極力短くなるよう、施工を進めること。

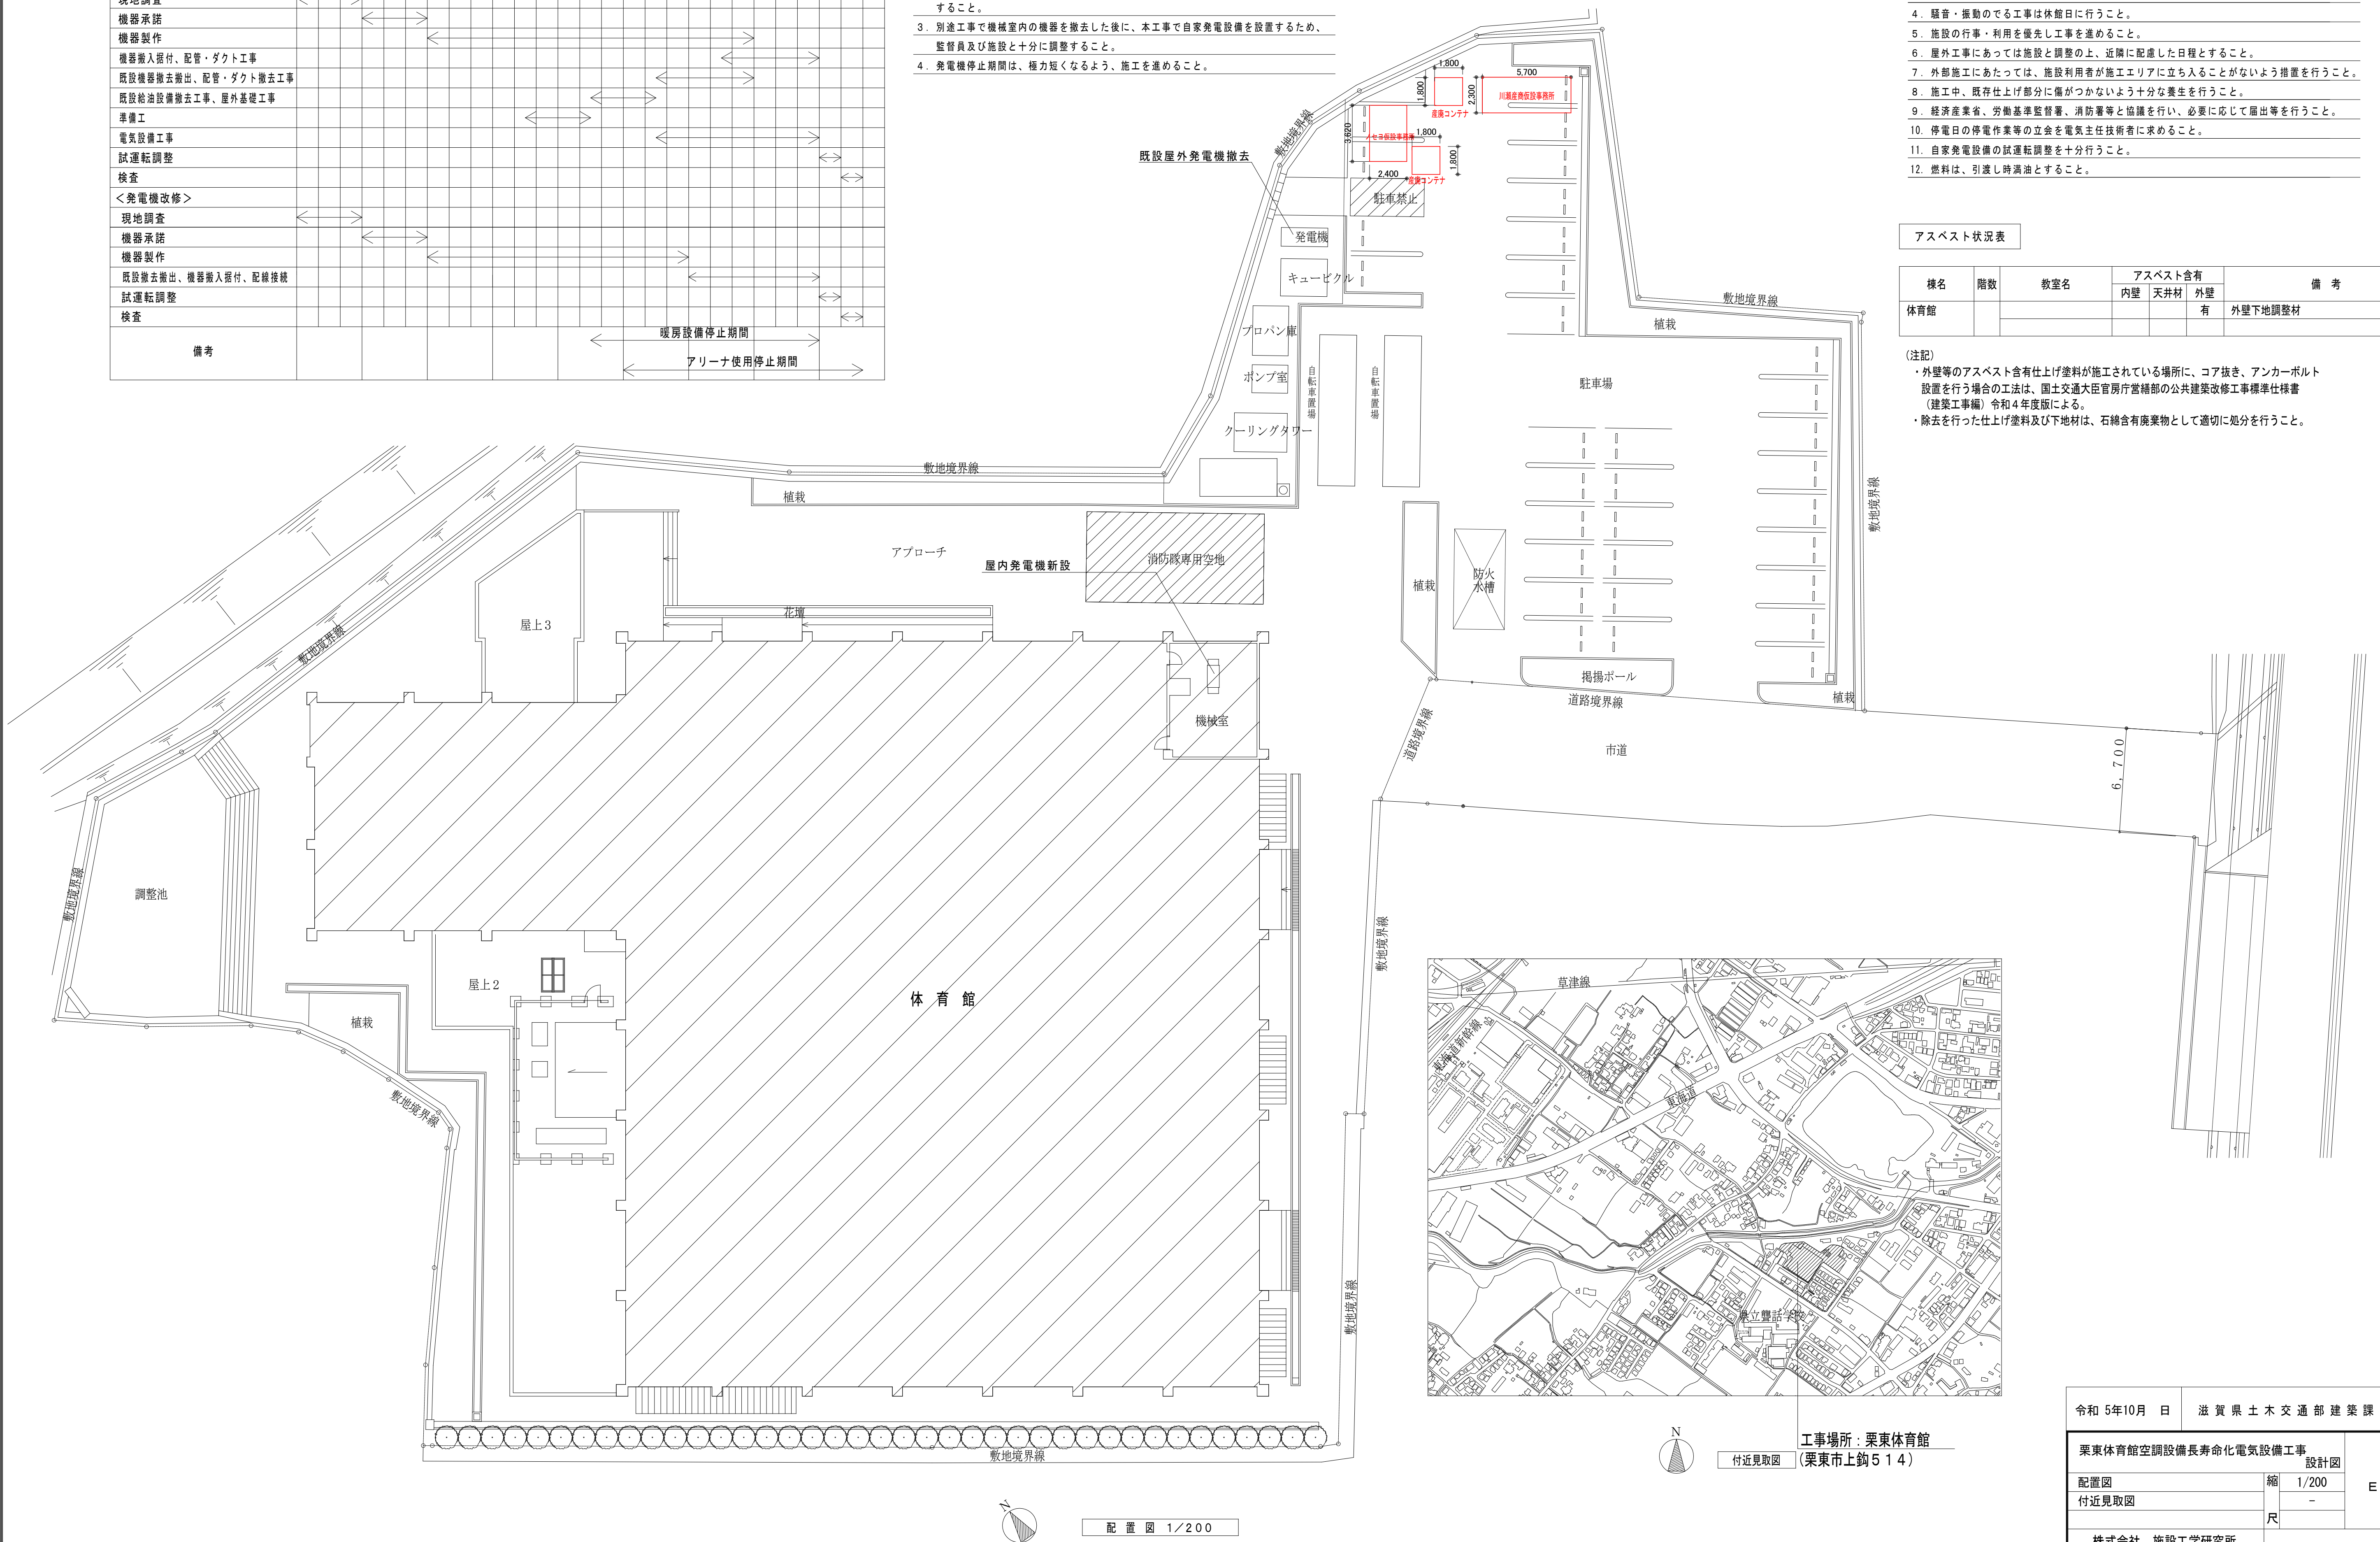

工事注意事項

1. 施設への車両進入に際しては、施設職員及び利用者に十分注意を払うこと。
2. 機器資材等搬出時には必要に応じて誘導を行い、施設利用者及び近隣の安全に配慮すること。
3. 車両状況等により傷めた敷地内道路等は、施工業者の負担により現状復旧を行うこと。
4. 騒音・振動のする工事は休館日を行うこと。
5. 施設の行事・利用を優先し工事を進めること。
6. 屋外工事については施設と調整の上、近隣に配慮した日程とすること。
7. 外館施工にあつては、施設利用者が施工エリアに立ち入りすることがないよう措置を行うこと。
8. 工中、既存仕上り部分に傷がつかないよう十分な養生を行うこと。
9. 経済産業省、労働基準監督署、消防署等と協議を行い、必要に応じて屋出等を行うこと。
10. 停電中の停電作業等の立会を電気主任技術者に求めること。
11. 自家発電設備の試運転調整を十分行うこと。
12. 燃料は、引渡し時満油とすること。

アスベスト状況表

棟名	階数	教室名	アスベスト含有			備 考
			内壁	天井材	外壁	
体育館					有	外壁下地調整材

(注記)

- ・外壁等のアスベスト含有仕上げ塗料が施工されている場所に、コア抜き、アンカーボルト設置を行う場合の工法は、国土交通大臣官庁房建築部の公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和4年度版による。
- ・除去を行った仕上げ塗料及び下材は、石綿含有廃棄物として適切に処分を行うこと。
